計画工程表(第1回変更)

工事名：富山管内舗装復旧工事

工期：令和6年9月3日～令和7年3月31日

工種・種別・細目	単位	当初発注数量	概算数量	1日の施工量	実働日数	稼働率	稼働日数
準備工・後片付 設計照査・施工計画・現地調査	式	1.0					
起工測量工・計画	式	1.0					
切削オーバーレイ工							
切削オーバーレイ　t=50mm	m2	22,000.0	38,567.0				
下り線							
金泉寺(下り線)　金泉寺	m2		1,610.0	536.6	3.0	2.0	6.0
金山新工区　金山新	m3		2,520.0	840.0	3.0	2.0	6.0
3工区　寺島	m2		1,680.0	840.0	2.0	2.0	4.0
八町・大塚工区　八町～大塚	m2		5,197.5	1299.3	4.0	2.0	8.0
本郷工区　本郷	m2		168.0	168.0	1.0	2.0	2.0
白石工区　小杉白石	m2		595.0	595.0	1.0	2.0	2.0
4工区　射水市大江	m2		4,998.0	1249.5	4.0	2.0	8.0
5工区　射水市稲積	m2		871.5	871.5	1.0	2.0	2.0
6工区　射水市津幡江	m2		3,860.5	965.1	4.0	2.0	8.0
7工区　射水市野村	m2		4,494.0	898.8	5.0	2.0	10.0
8工区　射水市布目	m2		2,450.0	1225.0	2.0	2.0	4.0
9工区　射水市沖塚原	m2		448.0	448.0	1.0	2.0	2.0
上り線							
金泉寺(上り線)　金泉寺	m2		2,586.5	862.1	3.0	2.0	6.0
2工区　新屋	m2		2,940.0	1470.0	2.0	2.0	4.0
11工区　射水市稲積	m2		2,695.0	1347.5	2.0	2.0	4.0
沖塚原工区　射水市沖塚原	m2		1,453.0	726.5	2.0	2.0	4.0
							0.0
舗装打替換工							
打換　t=150mm	m2	6,000.0	29.0	29.0	1.0	2.0	2.0
アスファルト舗装補修工							
クラック処理　加熱注入型	m	2,500.0					
クラック防止シート　W330mm	m	2,500.0					
クラック防止シート　W=500mm	m	2,500.0					
区画線工							
区画線　溶融式	m		15,249.0				
カッター目地工							
舗装切断　W=10mm　t=50mm	m		5,792.8				
注入　W=10mm　t=50mm	m		5,792.8				
仮設工							
交通管理　誘導員A	式	1.0	1.0				
交通管理　誘導員A	式	1.0	1.0				

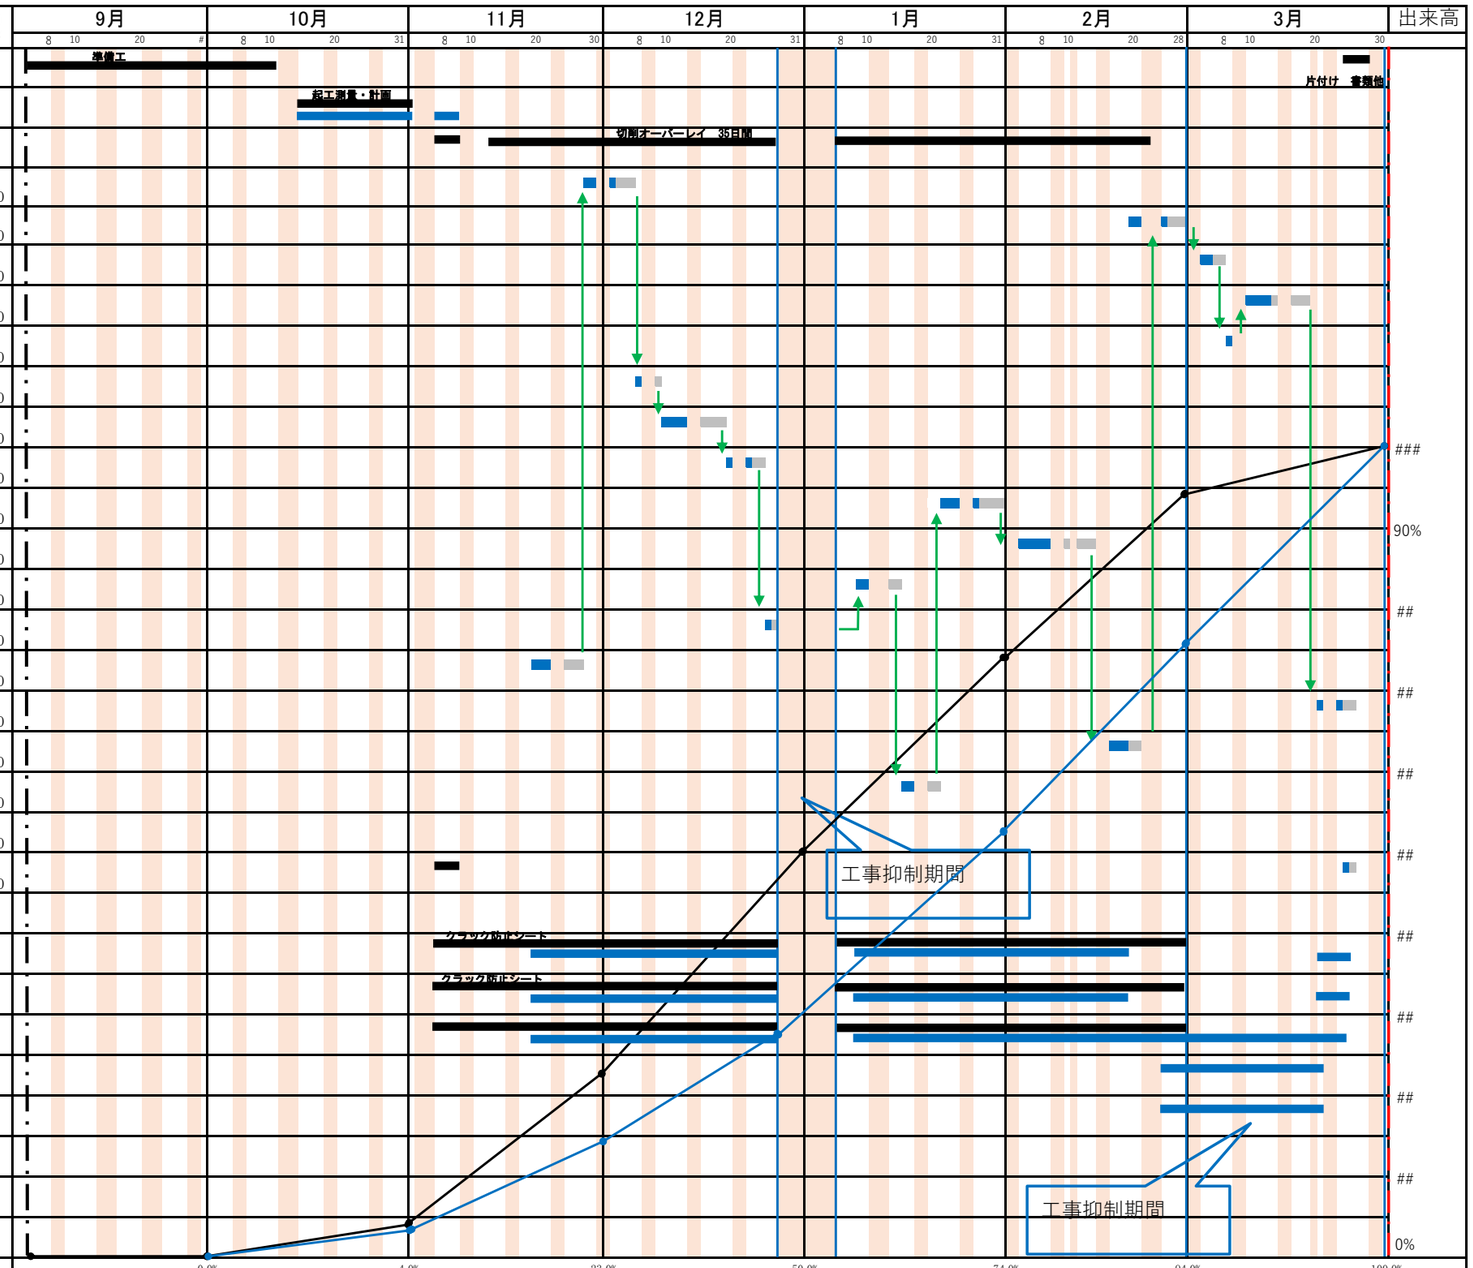

出来高　%
●―●：計画
●―●：実施

出来高	当初計画	0.0% 4.0% 23.0% 50.0% 74.0% 94.0% 100.0%
	第1回変更	4.0% 14.4% 32.7% 52.1% 75.4% 100.0%
	実施	
週休2日の計画と実績	計画	
	実施	
ウィークリー・スタンス	①マンデー・ノーピリオド	
	凡例：　履行：○　不履行：×	
